

PROJETO “ATÉ COM CHUVA”

ASSOCIAÇÃO CENTRO DO IDOSO VIDA MAIS

2021



ANEXO 2: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: Centro do Idoso Vida Mais

Período de monitoramento: Janeiro 2022

Termo Colaboração: 002/2021

1. Descrição detalhada das metas/indicadores: (inserir as atividades realizadas pela OSC conforme previsto no Plano de Trabalho)

META 1: Fechamento da Piscina de Hidroginástica.

ATIVIDADE 1:

DESCRIÇÃO	ETAPA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Início das Obras de fechamento da piscina	Abertura das canaletas para colocar os trilhos onde serão colocados os vidros (Blindex)	Semanal	Ferramentas e canaletas de alumínio já inclusos no orçamento total	Preparação para instalação do Vidro (Blindex) no entorno da piscina	(x) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Não se aplicou no momento

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.com.br – Site: www.vidamaisitapira.com.br

ATIVIDADE 2:

DESCRIÇÃO	ETAPA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Fechamento da Piscina onde são realizadas as aulas de hidroginástica.	Colocação das estruturas metálicas aéreas para o fechamento total	Semanal	Estruturas fixas de alumínio	Preparação para a cobertura aérea lateral	<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Não se aplicou neste período.

ATIVIDADE 3:

DESCRIÇÃO	ETAPA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Início do Fechamento total da Piscina	Início da colocação das paredes fixas e das portas de correr (Blindex)	Semanal	Chapas de Vidro (Blindex)	Fechamento de 80% da área da piscina	() INTEGRAL (X) PARCIAL () NÃO EXECUTADA	Falta de material para finalizar a obra

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:


Não se aplicou neste período.

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP
Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.com.br – Site: www.vidamaisitapira.com.br

2. Comprovação das metas através de fotos da execução:

ANEXO 1.

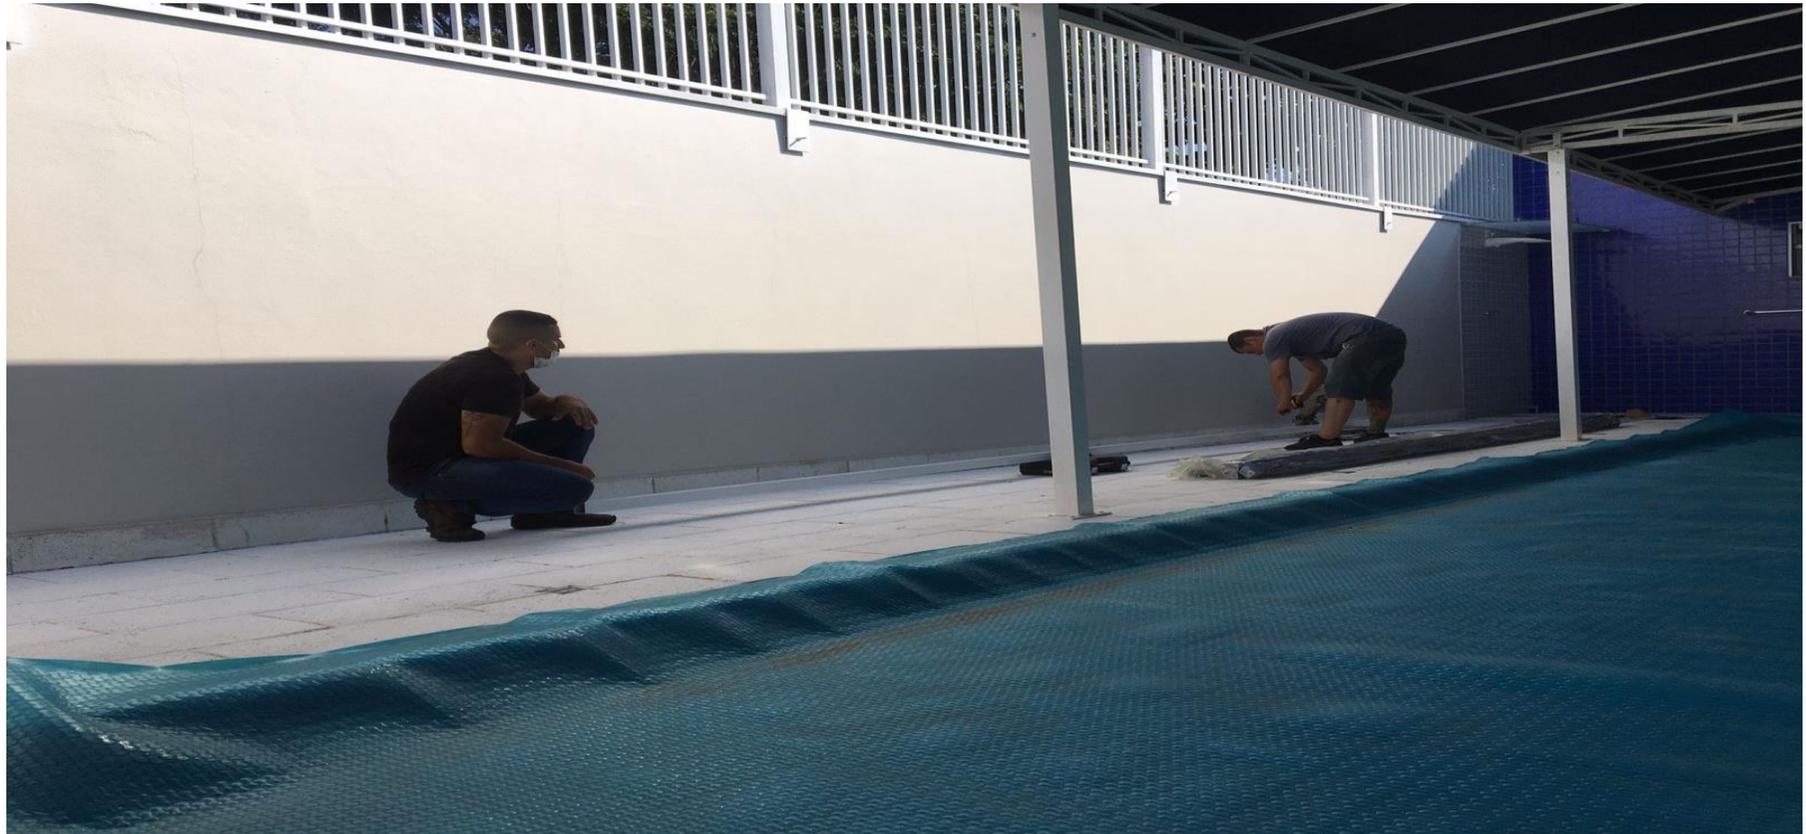

Segue foto da abertura das canaletas.

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.com.br – Site: www.vidamaisitapira.com.br

Anexo 2.



Segue fotos da colocação das estruturas de alumínio para fechamento lateral aéreo.

Anexo 3.



Fechamento total da piscina com chapas de Vidro (Blindex), bem como instalação das portas de correr

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.com.br – Site: www.vidamaisitapira.com.br



3. Demonstre os percentuais conforme Monitoramento e Avaliação apresentados no Plano de Trabalho:

Declaração Mensal do Serviço Descrição	Quantidade		Comentários
	Prévia	Real	
Execução total da obra, conforme previsto no plano de trabalho.	100%	75%	Estamos na espera do restante dos materiais para a conclusão total da obra

Lucas Tiago de Oliveira da Silva
Assistente Social
CRESS 59475

Maria Aparecida Martins Colosso
Diretora Financeira

Itapira, 16 de fevereiro de 2022.
